**AXING Zrt**
HU-1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Tel: +36 01 248 0779, www.axing.hu, kapcsolat@axing.hu

# Éves energetikai szakeferens jelentés

**Cégnév: Ferrobeton Zrt.**

**Időszak: 2025**

## Általános tudnivalók az AXING-20 éves energetikai szakreferens jelentésről:

A jelentés a Ferrobeton Zrt. 2025 évi energia felhasználási adatainak összefoglalása, amelyet az Axing Zrt készít ügyfelei számára. A jelentés a rendszeresen elkészített havi jelentések összesítése, és az energetikai, energia hatékonysági adatok, információk, statisztikák vonatkozásában kínál rendszerezett áttekintést.

A jelentés kiadása összhangban van az alábbi jogszabályokban, illetve azokhoz készített kiegészítő adatforrásokban foglalt rendelkezésekkel:

- 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
- 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
- 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről
- MEKH_ENHAT_VALLALAT abev nyomtatványkitöltő rendszer, kitöltési útmutató
- MEKH Energiahatékonyság GYIK (Gyakran ismételt kérdések)

A jelentés a szakreferens kötelezett gazdálkodó szervezet és az Axing Zrt. között létrejött „MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS energetikai szakreferensi tevékenység ellátására” dokumentum alapján készült és az abban foglalt energia hatékonysággal kapcsolatos feladatainak teljesítésére szolgál.

A jelentés szerzői jogainak tulajdonosa az Axing Zrt, aki kifejezetten tiltja a dokumentum egészének, formátumának, egyes részeinek szerzői engedély nélküli olyan felhasználását, ami a szerző feltüntetése nélkül történik. A jelentés egyedi példányának felhasználói joga a konkrét Axing Zrt-vel szerződött gazdálkodó szervezett, amely címzettje a jelentésnek.

A jelentés adattartalmát a szakreferens kötelezett gazdálkodó szervezet tulajdonát képező energia fogyasztási és energia költség adatok képezik, amelyek rendszeres elektronikus adatcsere, vagy egyedi adatszolgáltatás útján kerültek az AXING-20 rendszerbe. Az adatok összesítésének szabályait a MEKH energia hatékonysággal kapcsolatos adatszolgáltatások rendjét meghatározó elnöki rendeletei határozzák meg.

A jogszabályokban előírt minimum követelmények teljesítése mellett az Axing Zrt. törekszik arra, hogy a jelentés tartalma elősegítse a gazdálkodó szervezet energia hatékonyságát, az energia felhasználásának csökkentését. A gazdálkodó szervezet energia hatékonyságát jelentősen befolyásolja a munkavállalók, illetve más érintettek szemlélete, hozzállása. A jelentés kifüggesztése, illetve az érintettek részére történő eljuttatása az érintettek energia felhasználással, energia költségekkel, illetve energia hatékonysággal kapcsolatos ismereteit bővíti, a gazdálkodó szervezeten belüli szemléletformálási intézkedésnek minősül.


A jelentés tartalmát az Axing Zrt. folyamatosan fejleszti, és szívesen veszi a jelentéssel kapcsolatos visszajelzéseket, kéréseket, észrevételeket a kapcsolat@axing.hu e-mail címen.

**Energiafogyasztási adatok:**

**Cégnév: Ferrobeton Zrt.**

**Időszak: 2025**

| energiahordozó | mértékegység | épület | tevékenység | szállítás | összesen | végső energia [kWh] | CO2 kibocsátás [ton] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| villamos energia | kWh | 1 052 890 | 745 656 | 0 | 1 798 545 | 1 798 545.49 | 395.68 |
| földgáz | Nm3 | 157 077 | 426 489 | 0 | 583 567 | 6 142 619.49 | 1 113.10 |
| gázolaj | liter | 0 | 0 | 61 396 | 61 396 | 600 635.69 | 151.36 |
| | | | | | | **8 541 800.67** | **1 660.14** |

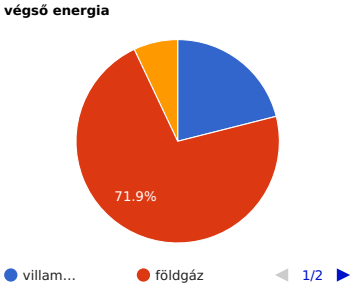





**CO2 kibocsátással kapcsolatos információk:**

Az éves energia felhasználásból származó összesített CO2 kibocsátás: **1 660.14** tonna, amely mennyiség ugyanannyi kibocsátásnak felel meg, mint:

| személyautóval megtett út | tengerentúli repülőút | azonos mennyiséget elnyelő erdőterület |
|---|---|---|
| **8 300 678** km | **1 107** db | **3 953** ha |


**Végsőenergia-fogyasztás éves alakulása [MWh]:**

A "végsőenergia-fogyasztás" a végfelhasználók (ipar, közlekedés, háztartások, szolgáltatások és a mezőgazdaság) számára szolgáltatott, az általuk ténylegesen felhasznált energia mennyiségét jelöli.

Cégnév: Ferrobeton Zrt.

Időszak: 2025

| energia hordozó | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| villamos energia | 243,84 | 258,43 | 206,38 | 158,80 | 118,28 | 97,12 | 112,18 | 96,93 | 96,08 | 124,61 | 150,28 | 135,61 | 1 798,55 |
| földgáz | 803,63 | 992,15 | 626,42 | 479,61 | 226,67 | 195,67 | 367,13 | 226,05 | 169,31 | 388,78 | 893,94 | 773,24 | 6 142,62 |
| gázolaj | 73,30 | 88,90 | 74,79 | 49,37 | 42,35 | 51,02 | 38,45 | 42,60 | 41,76 | 29,03 | 35,44 | 33,62 | 600,64 |
| **Összesen** | **1 120,77** | **1 339,49** | **907,59** | **687,78** | **387,30** | **343,82** | **517,76** | **365,57** | **307,16** | **542,43** | **1 079,66** | **942,47** | **8 541,80** |

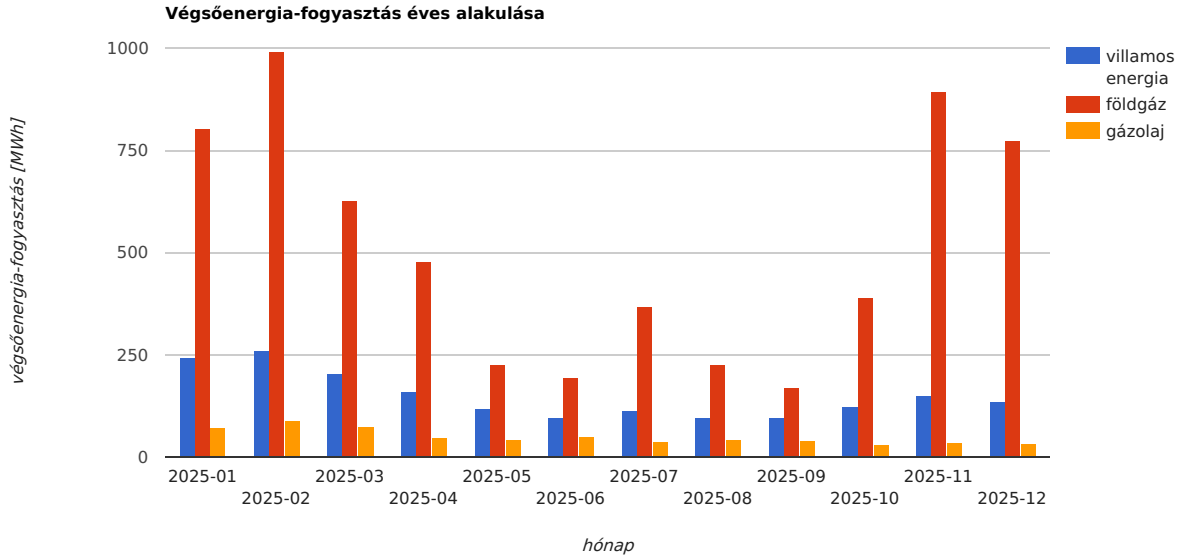


**Energiafelhasználás telephelyenként:**


**Cégnév: Ferrobeton Zrt.**

**Időszak: 2025**

| név | cím | villamos energia [kWh] | földgáz [Nm3] | távhő [MJ] | egyéb energiahordozók [MWh] | végső energia [MWh] | CO2 kibocsátás [ton] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrobeton Dunaújváros | Dunaújváros Papírgyári út 18-22. | 1 233 005 | 562 369 | 0 | 0 | 7 152,49 | 1 343,92 |
| Ferrobeton Szolnok | Szolnok Piroskai út 1. | 385 658 | 11 429 | 0 | 601 | 1 106,60 | 258,00 |
| Ferrobeton Hird | Pécs-Hird Hirdi út 18. | 21 674 | 9 769 | 0 | 0 | 124,50 | 23,40 |
| Ferrobeton Orfű | Orfű Dollár utca 17. | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 1,42 | 0,31 |
| Ferrobeton Dunakeszi | Dunakeszi Székesdűlő sor 133. | 156 785 | 0 | 0 | 0 | 156,78 | 34,49 |
| **Összesen** | | **1 798 545** | **583 567** | **0** | **601** | **8 542** | **1 660** |

**Energiafelhasználás telephelyenként:**

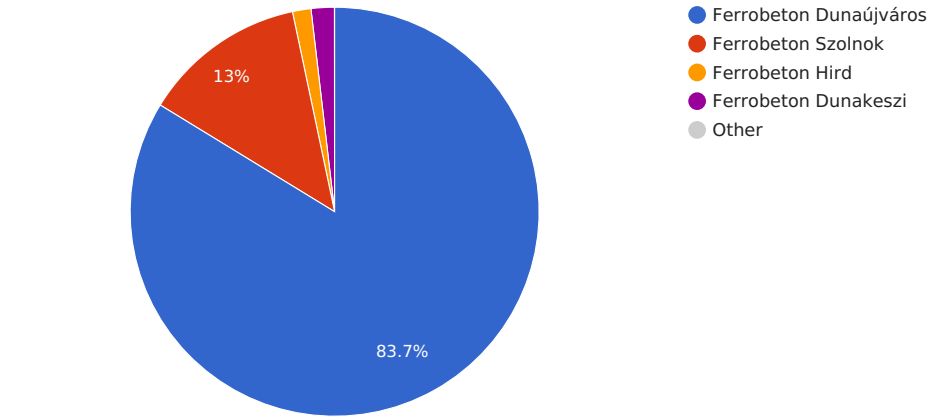
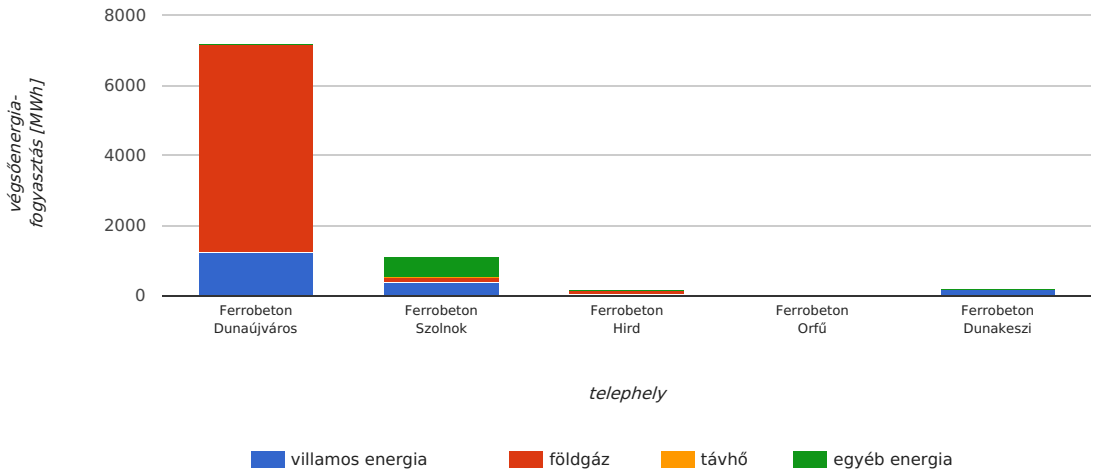
## Megvalósult energiahatékonyságot növelő intézkedésekkel elért energiamegtakarítás

### Korábbi intézkedések hatása

| intézkedés | üzembe helyezés | telephely | érintett műszaki rendszer | elért éves energiamegtakarítás | mértékegység | energiamegtakarítás aránya a cég teljes energiafelhasználásához képest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| új korszerű LED-es 90W/4000K BK 100DEG lámpák beépítése | 2020-04-15 | Ferrobeton Hird | Világítási rendszer | 348,00 | kWh | 0.004% |
| A régi neon fénycsöves lámpatestek cseréje 18 és 24W-os ledes lámpatestekre | 2020-08-31 | Ferrobeton Dunaújváros | Világítási rendszer | 3 724,00 | kWh | 0.044% |
| Nátriumlámpák cseréje korszerű LED lámpákra | 2020-09-07 | Ferrobeton Dunaújváros | Térvilágítási rendszer | 1 657,00 | kWh | 0.019% |
| 8-as kazán pneumatikus fűtésvezérlését biztosító kompresszor cseréje | 2020-10-05 | Ferrobeton Dunaújváros | Technológiai fűtés | 3 040,00 | kWh | 0.036% |
| A régi neon fénycsöves lámpatestek korszerű ledes fénycsövekre cseréje. | 2022-12-10 | Ferrobeton Dunaújváros | Világítási rendszer | 78 500,00 | kWh | 0.919% |
| A technológiához szükséges érleléshez felhasznált gőzmennyiség csökkentése kötésgyorsító vegyszerek alkalmazásával | 2023-02-28 | Ferrobeton Dunaújváros | Földgázfogyasztás | 0,00 | kWh | 0.000% |
| A gőzfejlesztők üzemidejének indításának, lekapcsolásának idejét a kazánkezelő Whatsapp rendszeren kapja a termeléstől, és 20 percen belül reagál a kérésre | 2023-10-31 | Ferrobeton Dunaújváros | Földgázfogyasztás | 0,00 | kWh | 0.000% |
| Az udvarban lévő 10 db régi halogén lámpatestek cseréje korszerű led lámpatestekre | 2023-12-01 | Ferrobeton Dunaújváros | Térvilágítási rendszer | 0,00 | kWh | 0.000% |
| A régi bitumenes tetőhéjazat cseréje új cserepes lemezre és az ereszrendszer valamint villámhárító rendszer felújítása. | 2023-12-31 | Ferrobeton Dunakeszi | Irodaépület tetőhéjazat cseréja | 0,00 | kWh | 0.000% |
| Az iroda, öltöző és a labor régi neoncsöves lámpatestjeinek cseréje led-es lámpatestekre | 2023-12-31 | Ferrobeton Dunakeszi | Épületvillamossági, világítási rendszer | 0,00 | kWh | 0.000% |
| 9db 6kW-os régi hőtárolós kályhák kiváltása modern 2kW-okra | 2023-12-31 | Ferrobeton Szolnok | Villamosenergia, épületfűtési rendszer | 0,00 | kWh | 0.000% |
| Hőközpont felújítás | 2024-03-06 | Ferrobeton Dunaújváros | | 39 998,77 | kWh | 0.468% |
| Világítás korszerűsítés | 2024-05-23 | Ferrobeton Szolnok | | 25 000,00 | kWh | 0.293% |
| Nyílászárók cseréje | 2024-06-05 | Ferrobeton Dunaújváros | | 14 999,54 | kWh | 0.176% |
| Nyílászárók cseréje | 2024-06-20 | Ferrobeton Dunaújváros | | 4 999,85 | kWh | 0.059% |
| Kazáncsere asztalosműhelyben | 2024-06-28 | Ferrobeton Dunaújváros | | 29 999,08 | kWh | 0.351% |
| Nyílászárók cseréje | 2024-07-05 | Ferrobeton Dunaújváros | | 59 998,15 | kWh | 0.702% |

| intézkedés | üzembe helyezés | telephely | érintett műszaki rendszer | elért éves energiamegtakarítás | mértékegység | energiamegtakarítás aránya a cég teljes energiafelhasználásához képest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elszívás javítása | 2024-07-19 | Ferrobeton Dunaújváros | | 20 000,00 | kWh | 0.234% |
| Elavult villamos kályhák cseréje korszerű infra panelre | 2024-09-13 | Ferrobeton Szolnok | | 10 000,00 | kWh | 0.117% |
| Világítás korszerűsítés | 2024-11-13 | Ferrobeton Dunaújváros | | 25 000,00 | kWh | 0.293% |
| Világítás korszerűsítés | 2024-11-21 | Ferrobeton Szolnok | | 25 000,00 | kWh | 0.293% |
| **Összesen** | | | | **342 264** | **kWh** | **4.007%** |

**Diagram az elért energiamegtakarításokról:**


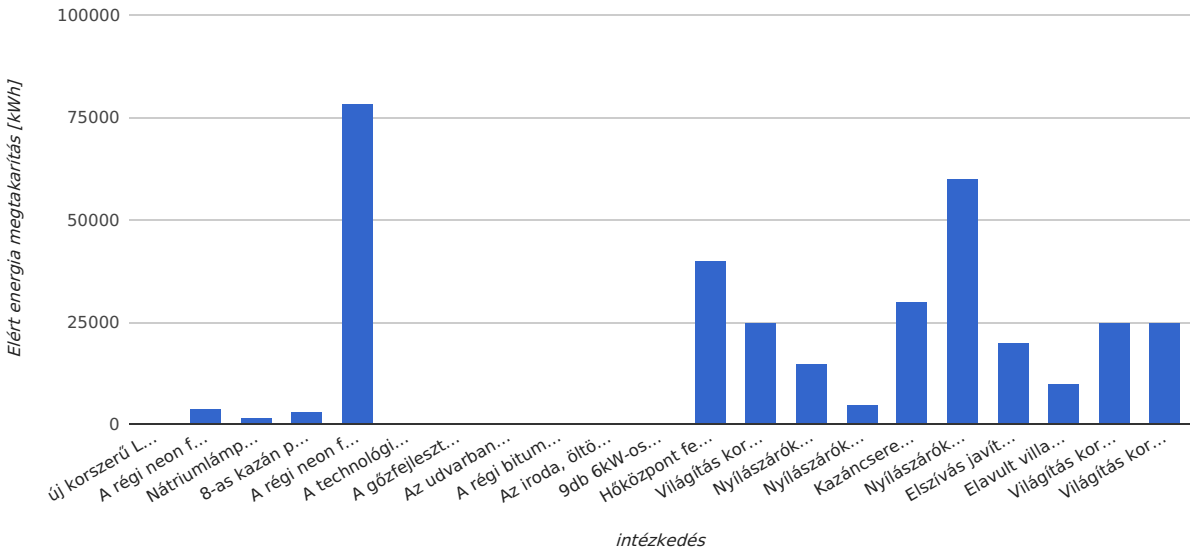



**Diagram az elért energiacsökkenés arányáról:**

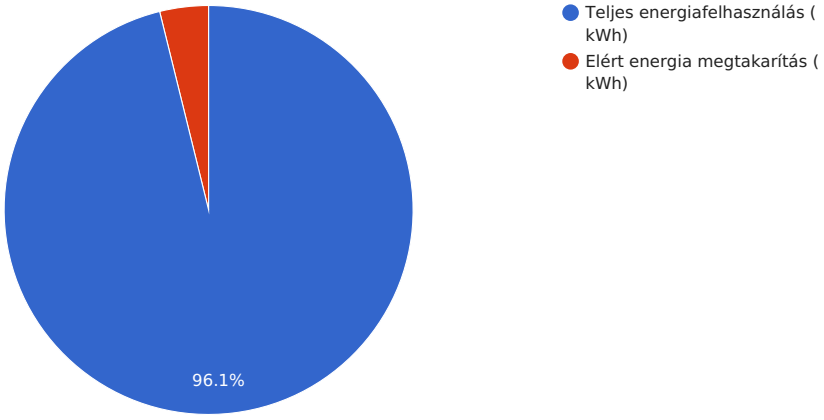

## Intézkedések által elért CO2 csökkenés

| intézkedés | elért éves energiamegtakarítás | mértékegység | CO2 csökkenés | mértékegység |
|---|---|---|---|---|
| új korszerű LED-es 90W/4000K BK 100DEG lámpák beépítése | 348,00 | kWh | 0,0766 | tonna |
| A régi neon fénycsöves lámpatestek cseréje 18 és 24W-os ledes lámpatestekre | 3 724,00 | kWh | 0,8193 | tonna |
| Nátriumlámpák cseréje korszerű LED lámpákra | 1 657,00 | kWh | 0,3645 | tonna |
| 8-as kazán pneumatikus fűtésvezérlését biztosító kompresszor cseréje | 3 040,00 | kWh | 0,6688 | tonna |
| A régi neon fénycsöves lámpatestek korszerű ledes fénycsövekre cseréje. | 78 500,00 | kWh | 17,2700 | tonna |
| A technológiához szükséges érleléshez felhasznált gőzmennyiség csökkentése kötésgyorsító vegyszerek alkalmazásával | 0,00 | kWh | 0,0000 | tonna |
| A gőzfejlesztők üzemidejének indításának, lekapcsolásának idejét a kazánkezelő Whatsapp rendszeren kapja a termeléstől, és 20 percen belül reagál a kérésre | 0,00 | kWh | 0,0000 | tonna |
| Az udvarban lévő 10 db régi halogén lámpatestek cseréje korszerű led lámpatestekre | 0,00 | kWh | 0,0000 | tonna |
| A régi bitumenes tetőhéjazat cseréje új cserepes lemezre és az ereszrendszer valamint villámhárító rendszer felújítása. | 0,00 | kWh | 0,0000 | tonna |
| Az iroda, öltöző és a labor régi neoncsöves lámpatestjeinek cseréje led-es lámpatestekre | 0,00 | kWh | 0,0000 | tonna |
| 9db 6kW-os régi hőtárolós kályhák kiváltása modern 2kW-okra | 0,00 | kWh | 0,0000 | tonna |
| Hőközpont felújítás | 39 998,77 | kWh | 7,2481 | tonna |
| Világítás korszerűsítés | 25 000,00 | kWh | 5,5000 | tonna |
| Nyílászárók cseréje | 14 999,54 | kWh | 2,7180 | tonna |
| Nyílászárók cseréje | 4 999,85 | kWh | 0,9060 | tonna |
| Kazáncsere asztalosműhelyben | 29 999,08 | kWh | 5,4361 | tonna |
| Nyílászárók cseréje | 59 998,15 | kWh | 10,8722 | tonna |
| Elszívás javítása | 20 000,00 | kWh | 4,4000 | tonna |
| Elavult villamos kályhák cseréje korszerű infra panelre | 10 000,00 | kWh | 2,2000 | tonna |
| Világítás korszerűsítés | 25 000,00 | kWh | 5,5000 | tonna |
| Világítás korszerűsítés | 25 000,00 | kWh | 5,5000 | tonna |
| **Összesen** | **342 264** | **kWh** | **69,4796** | **tonna** |

## CO2 csökkenéssel kapcsolatos információk

Az elért energiafogyasztás csökkenésből származó CO2 kibocsátás csökkenés **69.48** tonna, amely mennyiség ugyanannyi kibocsátásnak felel meg, mint:

| személyautóval megtett út | tengerentúli repülőút | azonos mennyiséget elnyelő erdőterület |
|---|---|---|
|  |  |  |
| **347 398** km | **46** db | **165** ha |

**Cégnév: Ferrobeton Zrt.**

**Időszak: 2025**


**Villamosenergia almérők és mért fogyasztások:**

**Telephely:** 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 18-22.


| név | mért energianem | éves fogyasztás | mértékegység | éves maximum [kW] |
|---|---|---|---|---|
| VE 11 Központi KARBANTARTÓ MŰHELY | Háromfázisú villamos energia | 8 556,03 | kWh | 598,2840 |
| VE21 Déli 2.5 MP CS BAKDARU | Háromfázisú villamos energia | 6 347,38 | kWh | 477,1604 |
| VE 22 Északi 2.5 MP CS BAKDARU | Háromfázisú villamos energia | 4 656,08 | kWh | 575,9208 |
| VE23 E1-ES YOGER SZEKRÉNY | Háromfázisú villamos energia | 11 100,49 | kWh | 398,7219 |
| VE 32 GÉPÉSZET ÖLTÖZŐ R/M/G | Háromfázisú villamos energia | 70 150,96 | kWh | 896,8181 |
| VE42 VASASCSARNOK DÉLI ELOSZTÓ | Háromfázisú villamos energia | 22 528,88 | kWh | 710,7845 |
| VE 43 VASAS CSARNOK NYUGATI ELOSZTÓ | Háromfázisú villamos energia | 12 330,16 | kWh | 660,9600 |
| VE 51 MOZDONY JAVÍTÓ / 5MP BAKDARU | Háromfázisú villamos energia | 4 842,31 | kWh | 308,6040 |
| VE 53 VASÜZEM KELETI OLDALI ELOSZTÓ | Háromfázisú villamos energia | 1 130,55 | kWh | 76,6564 |
| VE 63 VASÜZEM NYUGATI OLDALI ELOSZTÓ | Háromfázisú villamos energia | 12 126,39 | kWh | 586,4641 |
| VE 71 BETONGYÁR VILL | Háromfázisú villamos energia | 7 631,46 | kWh | 347,1084 |
| VE 72 KAVITOS OSZTÁLYOZÓ /SZIVATTYÚ HÁZ VILL. | Háromfázisú villamos energia | 2 363,37 | kWh | 125,9877 |
| UV 81 C-CSARNOK YOGER SZEKRÉNY/ REFLEKTOR T | Háromfázisú villamos energia | 11 059,43 | kWh | 600,9010 |
| UV82 POLIGON VILL | Háromfázisú villamos energia | 42 086,80 | kWh | 868,6810 |
| TARTALÉK_1 | Háromfázisú villamos energia | 0,00 | kWh | 0,0000 |
| TARTALÉK_2 | Háromfázisú villamos energia | 0,00 | kWh | 0,0000 |
| TR1 | Háromfázisú villamos energia | 0,00 | kWh | 0,0000 |
| E-022 HÁZGYÁR CSARNOK ÉSZAK | Háromfázisú villamos energia | 65 949,02 | kWh | 832,4451 |
| E-031 BETON ÜZEM 2 EM. | Háromfázisú villamos energia | 59 984,41 | kWh | 517,8801 |
| E-032 GEYER SZEKRÉNY SZ HÁZ | Háromfázisú villamos energia | 114 754,02 | kWh | 846,1505 |
| E-041/1 FESZÍTETT ÜZEM HAJÓ FŐ EO | Háromfázisú villamos energia | 79 891,84 | kWh | 562,7968 |
| E-041/2 FESZÍTETT ÜZEM HAJÓ FŐ EO. | Háromfázisú villamos energia | 79 046,64 | kWh | 562,8324 |
| E-041/3 FESZÍTETT ÜZEM HAJÓ FŐ EO. | Háromfázisú villamos energia | 38 782,80 | kWh | 653,5214 |
| E-051/1 3-AS DARU PÁLYA | Háromfázisú villamos energia | 4 161,10 | kWh | 535,2737 |
| E-051/1 4-AS DARU PÁLYA | Háromfázisú villamos energia | 2 807,84 | kWh | 71,3718 |
| E-052/1 1-ES DARU PÁLYA | Háromfázisú villamos energia | 11 349,92 | kWh | 212,5601 |
| E-052/2 0-S CSARNOK DARUK | Háromfázisú villamos energia | 10 599,36 | kWh | 152,9362 |
| TR2 | Háromfázisú villamos energia | 1 214 113,27 | kWh | 531,2000 |
| E 071 7 .Cella Vasas Asteba Halohegesztőgép | Háromfázisú villamos energia | 3 894,09 | kWh | 636,2481 |
| E 072 7. CELLA VASAS ASTEBA HALOHEGESZTŐGÉP | Háromfázisú villamos energia | 17 281,39 | kWh | 670,1215 |
| E 081 8 CELLA VASAS E-081 14SZ. | Háromfázisú villamos energia | 9 549,18 | kWh | 586,7522 |
| E082 8 CELLA I SZ. KELETI E082 15 SZ FŐKAP | Háromfázisú villamos energia | 3 167,93 | kWh | 514,8159 |
| E 083 8 CELLA I.CSARNOK 083 03 SZ | Háromfázisú villamos energia | 53 927,81 | kWh | 953,6826 |
| 10. CELLA VASBETON VÍZ , PORTA VÍZ | Háromfázisú villamos energia | 24 993,07 | kWh | 561,7401 |
| 11 CELLA TÉRVILÁGÍTÁS | Háromfázisú villamos energia | 24 554,01 | kWh | 700,1609 |

Az Axing Zrt kijelenti, hogy a fenti mérési adatok az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletben előírtaknak megfelelőek. A mérési adatokat 15 perces bontásban az Axing Zrt tárolja.

**Telephelyen mért teljes villamosenergia fogyasztás**

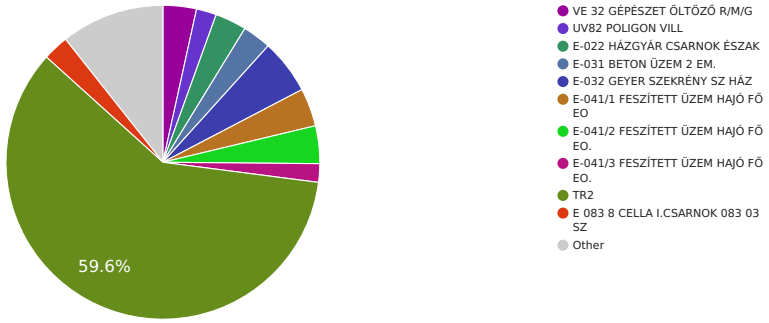


**Fogyasztási adatok**

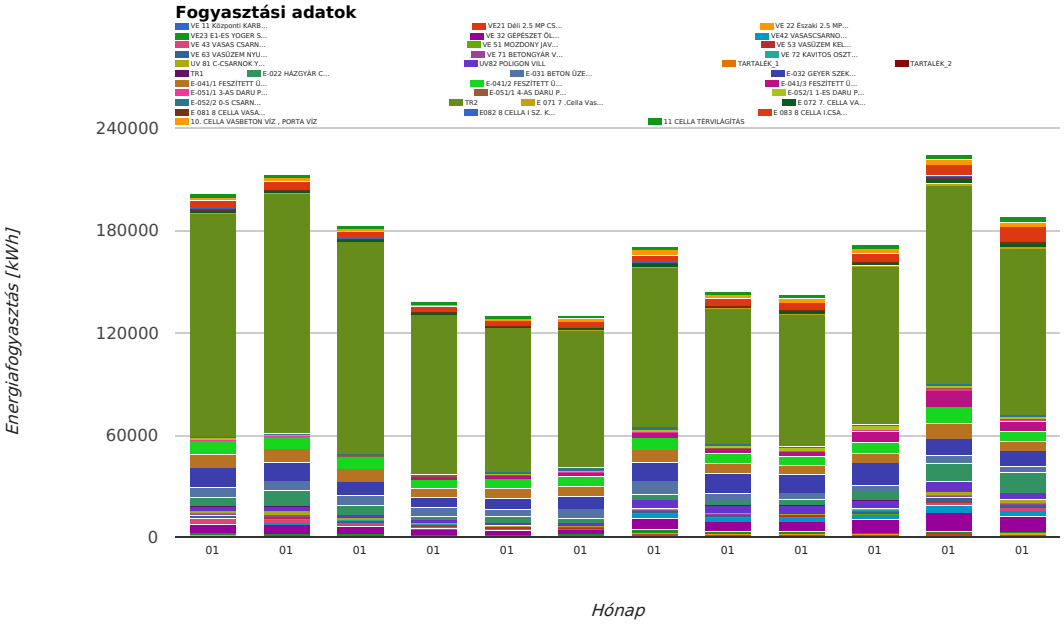



**Telephely:** 5000 Szolnok, Piroskai út 1.

| név | mért energianem | éves fogyasztás | mértékegység | éves maximum [kW] |
|---|---|---|---|---|
| GYÁRTÓ CSARNOKI DARU (15/2 SZÁMÚ LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 6 338,73 | kWh | 37,4560 |
| AUTÓBONTÓ + VODAFONE (11/1 SZÁMÚ LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 3 851,33 | kWh | 17,5200 |
| 7/3 KOMPRESSZOR TEREM | Háromfázisú villamos energia | 2 833,15 | kWh | 8,8880 |
| 6/3 MUTIFOR | Háromfázisú villamos energia | 0,00 | kWh | 0,0000 |
| 7/2 KOMPRESSZOR TEREM | Háromfázisú villamos energia | 540,17 | kWh | 1,4328 |
| 7/1 STEBA | Háromfázisú villamos energia | 2,58 | kWh | 1,6963 |
| 5/1 TMK ERŐÁTVITEL | Háromfázisú villamos energia | 35 994,87 | kWh | 38,8800 |
| 5/2 MÉRLEGHÁZ VILÁGÍTÁS | Háromfázisú villamos energia | 0,00 | kWh | 0,0000 |
| 5/3 TEKEPÁLYA | Háromfázisú villamos energia | 234,07 | kWh | 3,2720 |
| 4/2 GYÁRTÓCSARNOK ERŐÁTVITEL | Háromfázisú villamos energia | 7 495,07 | kWh | 48,9600 |
| 3/1 2.BETONGYÁR | Háromfázisú villamos energia | 769,23 | kWh | 14,5880 |
| 3/2 1.BETONGYÁR | Háromfázisú villamos energia | 598,41 | kWh | 1,9240 |
| 2/1 IRODAHÁZ VILÁGÍTÁS | Háromfázisú villamos energia | 6 305,32 | kWh | 12,1760 |
| 2/2 ADALÉKANYAG TÁROLÓ | Háromfázisú villamos energia | 2 342,31 | kWh | 53,4640 |
| 2/3 CSŐGYÁRTÁS | Háromfázisú villamos energia | 0,02 | kWh | 0,0017 |
| NA | Háromfázisú villamos energia | 0,00 | kWh | 0,0000 |
| NA | Háromfázisú villamos energia | 0,00 | kWh | 0,0008 |
| GYÁRTÓ CS VILLANY (14/1 SZÁMÚ LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 27 888,63 | kWh | 25,6800 |
| VAGONÜRÍTŐ (15/1 SZÁMÚ LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 6 907,69 | kWh | 11,0852 |


| név | mért energianem | éves fogyasztás | mértékegység | éves maximum [kW] |
|---|---|---|---|---|
| IRODA SZOC PORTA (11/2 LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 13 752,29 | kWh | 20,4400 |
| VASAS ÜZEM (12/3 LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 12 629,72 | kWh | 35,7600 |
| SPAN DECH VILÁGÍTÁS (14/2 LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 0,00 | kWh | 0,0000 |
| SPAN DEH (13/1 LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 71 694,16 | kWh | 94,5760 |
| SLIPFORM TECH (4/3 LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 4 448,15 | kWh | 21,8400 |
| SPAN DECH KEVERŐ (4/1 LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 11 498,47 | kWh | 85,3800 |
| KÉSZÁRU TÁROLÓ;III-IV PÁLYA (12/1 LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 2 883,97 | kWh | 8,0480 |
| TARTALÉK | Háromfázisú villamos energia | 0,00 | kWh | 0,0001 |
| KÉSZÁRU TÁROLÓ;I-II. PÁLYA (12/2 LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 7 472,12 | kWh | 15,8280 |
| ÚJ VASAS (14/3 LEÁG) | Háromfázisú villamos energia | 0,00 | kWh | 0,0016 |

Az Axing Zrt kijelenti, hogy a fenti mérési adatok az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletben előírtaknak megfelelőek.
A mérési adatokat 15 perces bontásban az Axing Zrt tárolja.

**Telephelyen mért teljes villamosenergia fogyasztás**

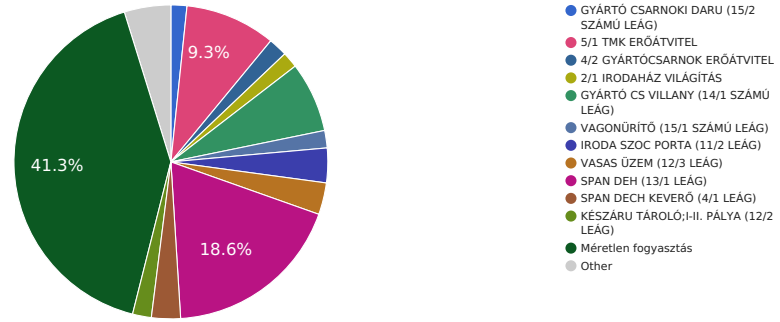


**Fogyasztási adatok**

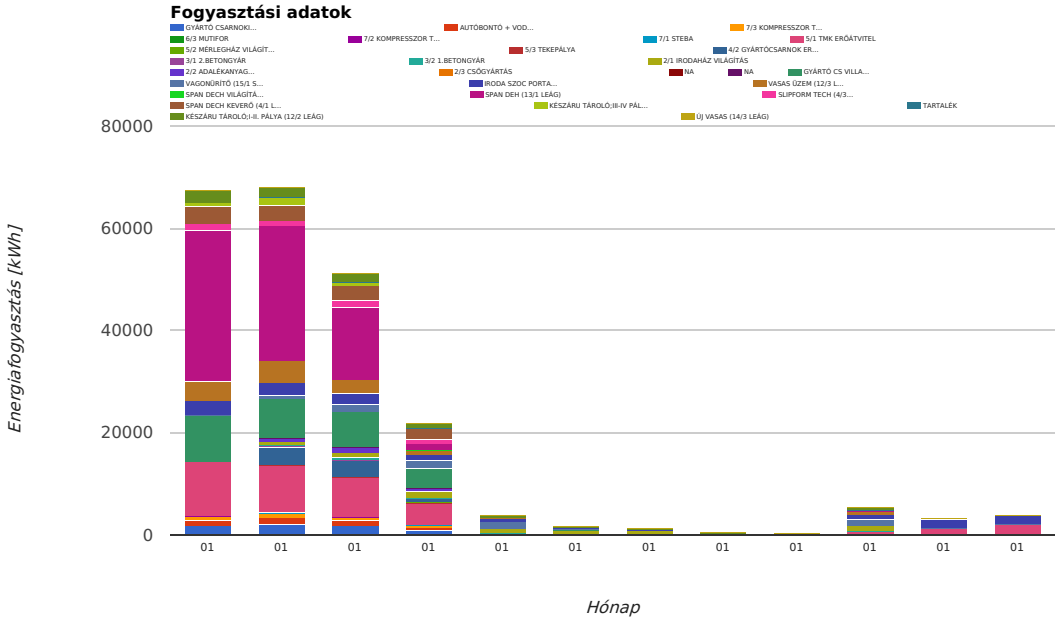


**Telephely:** 7693 Pécs-Hird, Hirdi út 18.

| név | mért energianem | éves fogyasztás | mértékegység | éves maximum [kW] |
|---|---|---|---|---|
| ALTRAFÓ BETÁPLÁLÁS | Háromfázisú villamos energia | 19 468,52 | kWh | 29,2400 |
| TÉRVILÁGÍTÁS | Háromfázisú villamos energia | 0,10 | kWh | 0,0080 |
| GYÁRTÓ CSARNOK ÜZEM | Háromfázisú villamos energia | 396,33 | kWh | 17,2920 |
| GÉP. MŰHELY IRODA | Háromfázisú villamos energia | 7 389,27 | kWh | 3,0560 |

| név | mért energianem | éves fogyasztás | mértékegység | éves maximum [kW] |
|---|---|---|---|---|
| SOC.ÉP. IRODA | Háromfázisú villamos energia | 5 686,62 | kWh | 3,2280 |
| AUTÓ SZER + PORTA + BÚVÁR SZIV. | Háromfázisú villamos energia | 274,11 | kWh | 2,2680 |
| NA | Háromfázisú villamos energia | 0,01 | kWh | 0,0114 |

Az Axing Zrt kijelenti, hogy a fenti mérési adatok az 1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletben előírtaknak megfelelőek. A mérési adatokat 15 perces bontásban az Axing Zrt tárolja.

**Telephelyen mért teljes villamosenergia fogyasztás**

